מזהה	מצב פעילות	שם פעילות	משך	התחלה	סיום
1		**מט"ש אשדוד - הרחבה ל- 70,000 מק"י**	**780 ימים**	**14/09/26**	**09/09/29**
2		**טיפול קדם וגרוסת**	**330 ימים**	**14/09/26**	**19/12/27**
3		ה.אזרחית	180 ימים	14/09/26	23/05/27
4		אלקטרומכאני חשמל ובקרה	120 ימים	12/04/27	26/09/27
5		הרצה	60 ימים	27/09/27	19/12/27
6		**משקע ראשוני**	**330 ימים**	**14/09/26**	**19/12/27**
7		ה.אזרחית	180 ימים	14/09/26	23/05/27
8		אלקטרומכאני חשמל ובקרה	120 ימים	12/04/27	26/09/27
9		הרצה	60 ימים	27/09/27	19/12/27
10		**מעכל אנארובי וחימום בוצה**	**450 ימים**	**14/09/26**	**04/06/28**
11		ה.אזרחית	270 ימים	14/09/26	26/09/27
12		אלקטרומכאני חשמל ובקרה	120 ימים	27/09/27	12/03/28
13		הרצה	60 ימים	13/03/28	04/06/28
14		**הסמכת בוצה**	**390 ימים**	**18/01/27**	**16/07/28**
15		ה.אזרחית	240 ימים	18/01/27	19/12/27
16		אלקטרומכאני חשמל ובקרה	120 ימים	08/11/27	23/04/28
17		הרצה	60 ימים	24/04/28	16/07/28
18		**סחיטת בוצה**	**390 ימים**	**24/05/27**	**19/11/28**
19		ה.אזרחית	240 ימים	24/05/27	23/04/28
20		אלקטרומכאני חשמל ובקרה	120 ימים	13/03/28	27/08/28
21		הרצה	60 ימים	28/08/28	19/11/28
22		**רחבת מערך שלישוני ות"ש קולחים שניוניים**	**390 ימים**	**08/11/27**	**06/05/29**
23		ה.אזרחית	240 ימים	08/11/27	08/10/28
24		אלקטרומכאני חשמל ובקרה	120 ימים	28/08/28	11/02/29
25		הרצה	60 ימים	12/02/29	06/05/29
26		**סלקטור**	**300 ימים**	**31/01/28**	**25/03/29**
27		ה.אזרחית	120 ימים	31/01/28	16/07/28
28		אלקטרומכאני חשמל ובקרה	120 ימים	17/07/28	31/12/28
29		הרצה	60 ימים	01/01/29	25/03/29
30		**עבודות שונות - ציוד, ת"ש וכו'**	**240 ימים**	**09/10/28**	**09/09/29**
31		ה.אזרחית	210 ימים	09/10/28	29/07/29
32		אלקטרומכאני חשמל ובקרה	120 ימים	01/01/29	17/06/29
33		הרצה	60 ימים	18/06/29	09/09/29
34		עבודות פיתוח	180 ימים	01/01/29	09/09/29

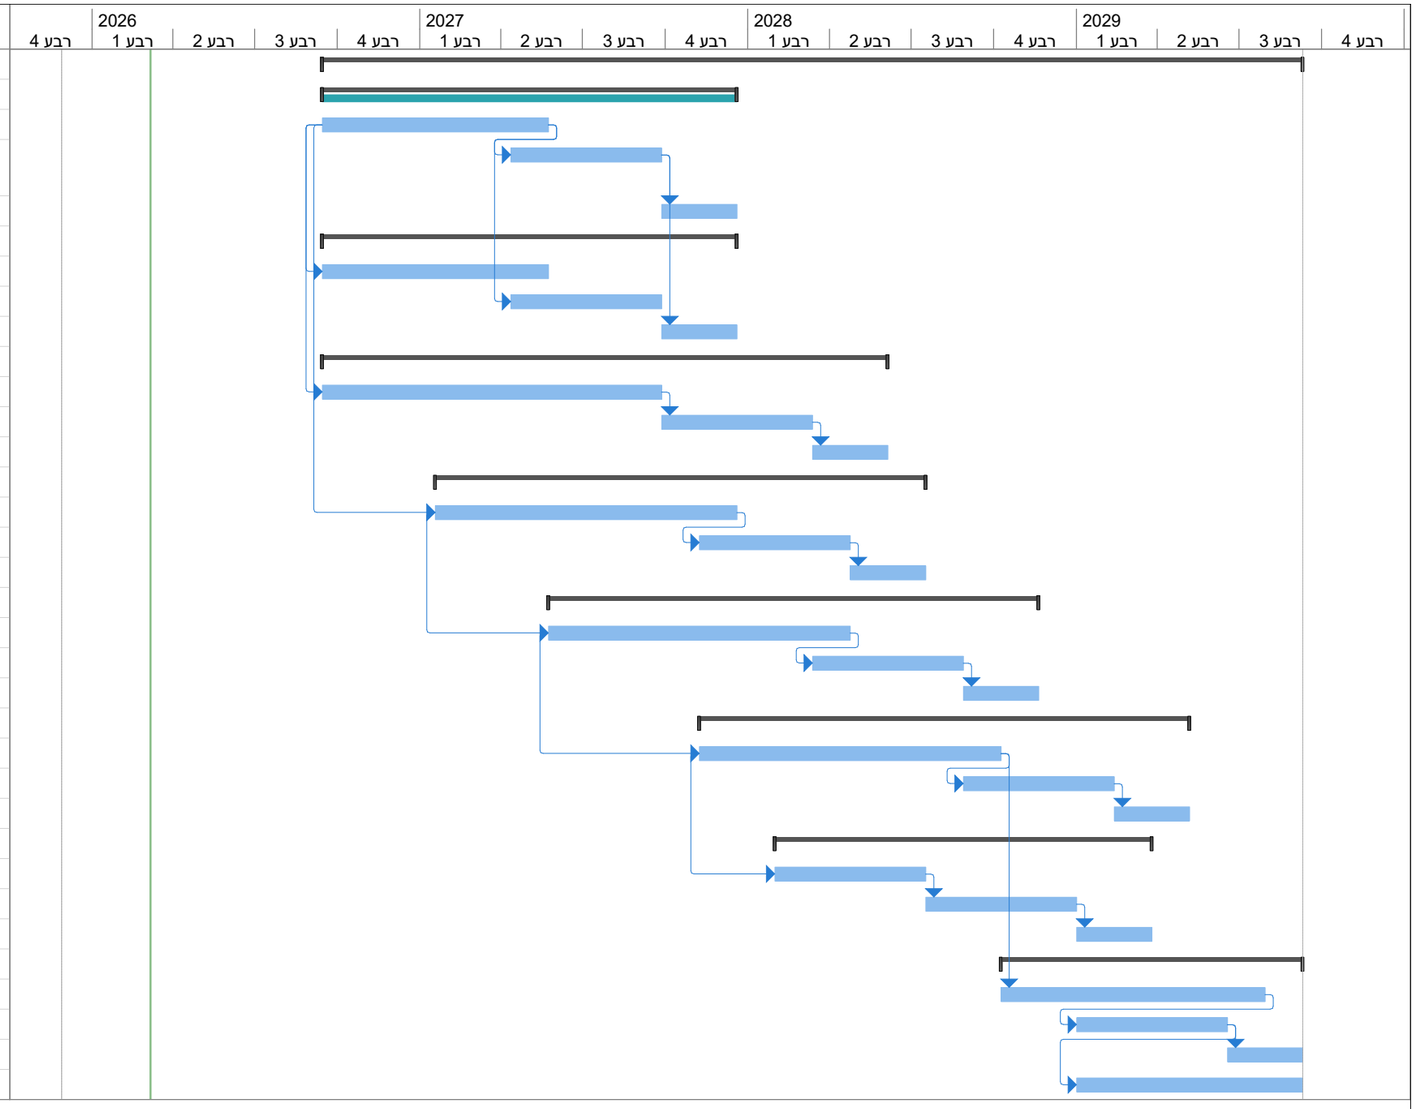

פרוייקט: לוח זמנים למפגש מציעים
תאריך: 07/03/26

פעילות | ערסל פרוייקט | פעילות ידנית | התחלה-בלבד | תאריך יעד
פיצול | פעילות לא פעילה | משך-בלבד | סיום-בלבד | התקדמות
אבן דרך | אבן דרך לא פעילה | סיכום ערסל ידני | פעילויות חיצוניות | התקדמות ידנית
ערסל | ערסל לא פעיל | ערסל ידני | אבן דרך חיצונית
